太陽電池ストリング開放電圧測定

試験日 ： 2023年 3月 7日
測定時間 ： 10時 ～ 12時
天候 ： 晴れ

実施者	[redacted]			
測定機器名	型式	メーカー	製造番号	校正有効期限
ﾃｽﾀｰ	DT4281	[redacted]	1.91E+08	2022/8/4

測定実施条件： 日射強度が300W/㎡以上で、1つのPCS内の測定中、強度が安定していること

合否基準

測定値	692V以上	←計算： 開放電圧×直列台数×0.8（照度、温度ロス）以上
平均との差	±2.38%	←計算： 1/直列数×50%（電圧に占めるモジュール1台の半分の割合）

例）Q.PEAK DUO ML-G9 390を8直列した場合
モジュールの開放電圧が41.2Vなので、測定値の基準値は、41.2×21×0.8≒692V ※小数点第1位を四捨五入
平均との差の基準は、1÷8×50≒6.25(%) ※小数点第2位を四捨五入

PCS No.	入力回路 No.	極性チェック	測定値（V）	平均値	平均との差	合否（○or×）	備考
01	1	良・否	861	860.5	0.1%	○	
	2	良・否	861		0.1%	○	
	3	良・否	860		−0.1%	○	
	4	良・否	860		−0.1%	○	
	5	良・否	861		0.1%	○	
	6	良・否	862		0.2%	○	
	7	良・否	860		−0.1%	○	
	8	良・否	860		−0.1%	○	
	9	良・否	861		0.1%	○	
	10	良・否	859		−0.2%	○	

※測定方法
①モジュールの接続確認は、日中の晴れまたはくもり時に行います。
（雲から太陽が出たり、隠れたりするようなときは、電圧が変化するため行わないこと）
②直流入力端子台の（＋）、（－）端子にテスターをあて、各ストリングごとのアレイ出力電圧が合否基準の692V以上であれば合格とする。テスターレンジは直流電圧レンジで測定すること
③測定値を記録する。
④正常状態（晴天時）であれば、アレイ出力電圧は入力動作電圧範囲内となる
（パネル出力でいくと、21直列のため、41.2V×21直列=865.2Vまでの電圧となる。）
（直流入力電圧が865.2V以上ある場合はストリング確認をすること。）
⑤接続されたケーブルの極性が正しいか、極性を確認する。

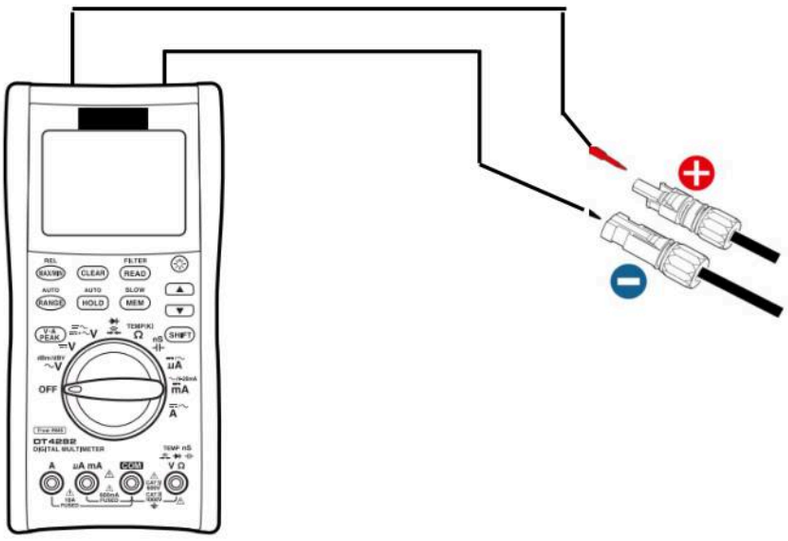

太陽電池ストリング開放電圧測定

試験日 ： 2023年 3月 7日
測定時間 ： 10時 ～ 12時
天候 ： 晴れ

実施者	[redacted]			
測定機器名	型式	メーカー	製造番号	校正有効期限
ﾃｽﾀｰ	DT4281	[redacted]	1.91E+08	2022/8/4

測定実施条件： 日射強度が300W/㎡以上で、1つのPCS内の測定中、強度が安定していること

合否基準

測定値	692V以上	←計算： 開放電圧×直列台数×0.8（照度、温度ロス）以上
平均との差	±2.38%	←計算： 1/直列数×50%（電圧に占めるモジュール1台の半分の割合）

例）Q.PEAK DUO ML-G9 390を8直列した場合
モジュールの開放電圧が41.2Vなので、測定値の基準値は、41.2×21×0.8≒692V ※小数点第1位を四捨五入
平均との差の基準は、1÷8×50≒6.25(%) ※小数点第2位を四捨五入

PCS No.	入力回路 No.	極性チェック	測定値（V）	平均値	平均との差	合否（○or×）	備考
02	1	良・否	859	859.8	−0.1%	○	
	2	良・否	859		−0.1%	○	
	3	良・否	859		−0.1%	○	
	4	良・否	859		−0.1%	○	
	5	良・否	861		0.1%	○	
	6	良・否	861		0.1%	○	
	7	良・否	860		0.0%	○	
	8	良・否	860		0.0%	○	
	9	良・否	860		0.0%	○	
	10	良・否	860		0.0%	○	

※測定方法
①モジュールの接続確認は、日中の晴れまたはくもり時に行います。
（雲から太陽が出たり、隠れたりするようなときは、電圧が変化するため行わないこと）
②直流入力端子台の（＋）、（－）端子にテスターをあて、各ストリングごとのアレイ出力電圧が合否基準の692V以上であれば合格とする。テスターレンジは直流電圧レンジで測定すること
③測定値を記録する。
④正常状態（晴天時）であれば、アレイ出力電圧は入力動作電圧範囲内となる
（パネル出力でいくと、21直列のため、41.2V×21直列=865.2Vまでの電圧となる。）
（直流入力電圧が865.2V以上ある場合はストリング確認をすること。）
⑤接続されたケーブルの極性が正しいか、極性を確認する。

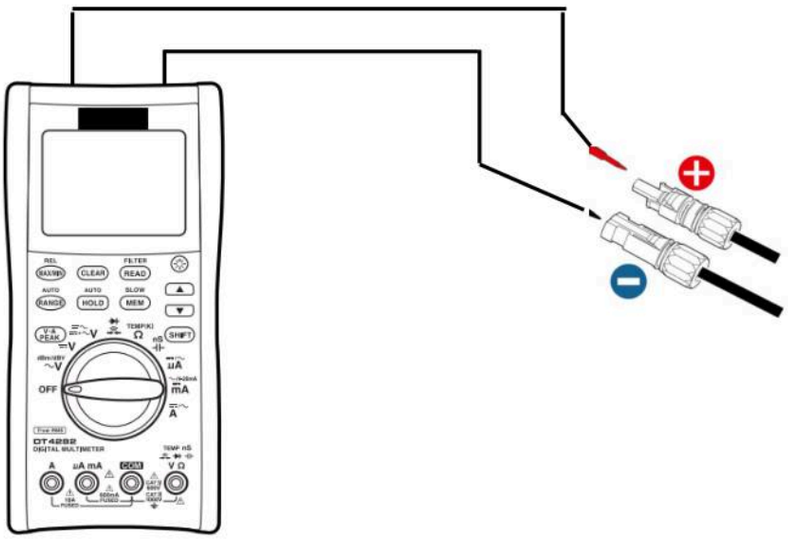

太陽電池ストリング開放電圧測定

試験日 ： 2023年 3月 7日
測定時間 ： 10時 ～ 12時
天候 ： 晴れ

実施者	[redacted]			
測定機器名	型式	メーカー	製造番号	校正有効期限
ﾃｽﾀｰ	DT4281	[redacted]	1.91E+08	2022/8/4

測定実施条件： 日射強度が300W/㎡以上で、1つのPCS内の測定中、強度が安定していること

合否基準

測定値	692V以上	←計算： 開放電圧×直列台数×0.8（照度、温度ロス）以上
平均との差	±2.38%	←計算： 1/直列数×50%（電圧に占めるモジュール1台の半分の割合）

例）Q.PEAK DUO ML-G9 390を8直列した場合
モジュールの開放電圧が41.2Vなので、測定値の基準値は、41.2×21×0.8≒692V ※小数点第1位を四捨五入
平均との差の基準は、1÷8×50≒6.25(%) ※小数点第2位を四捨五入

PCS No.	入力回路 No.	極性チェック	測定値（V）	平均値	平均との差	合否（○or×）	備考
03	1	良・否	862	862.0	0.0%	○	
	2	良・否	862		0.0%	○	
	3	良・否	862		0.0%	○	
	4	良・否	861		−0.1%	○	
	5	良・否	861		−0.1%	○	
	6	良・否	861		−0.1%	○	
	7	良・否	862		0.0%	○	
	8	良・否	863		0.1%	○	
	9	良・否	863		0.1%	○	
	10	良・否	863		0.1%	○	

※測定方法

①モジュールの接続確認は、日中の晴れまたはくもり時に行います。
（雲から太陽が出たり、隠れたりするようなときは、電圧が変化するため行わないこと）
②直流入力端子台の（＋）、（－）端子にテスターをあて、各ストリングごとのアレイ出力電圧が合否基準の692V以上であれば合格とする。テスターレンジは直流電圧レンジで測定すること
③測定値を記録する。
④正常状態（晴天時）であれば、アレイ出力電圧は入力動作電圧範囲内となる
（パネル出力でいくと、21直列のため、41.2V×21直列=865.2Vまでの電圧となる。）
（直流入力電圧が865.2V以上ある場合はストリング確認をすること。）
⑤接続されたケーブルの極性が正しいか、極性を確認する。

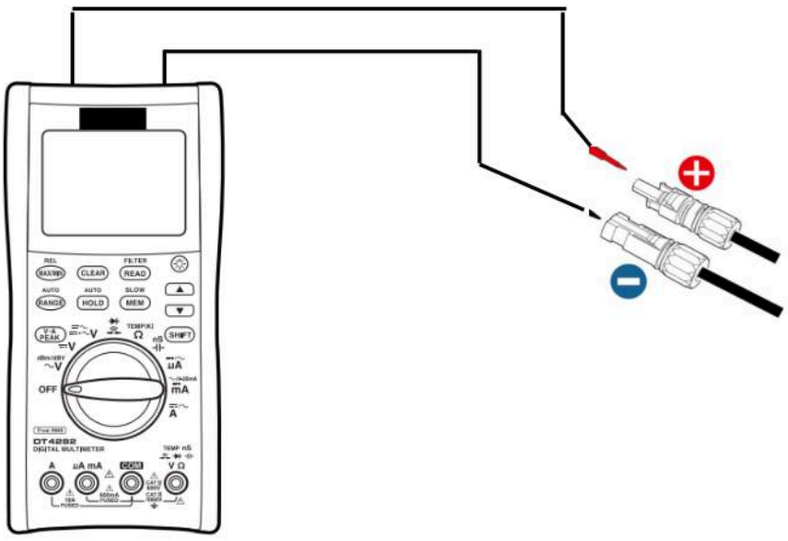

太陽電池ストリング開放電圧測定

試験日 ： 2023年 3月 7日
測定時間 ： 10時 ～ 12時
天候 ： 晴れ

実施者	[redacted]			
測定機器名	型式	メーカー	製造番号	校正有効期限
ﾃｽﾀｰ	DT4281	HIOKI	[redacted]8	2022/8/4

測定実施条件： 日射強度が300W/㎡以上で、1つのPCS内の測定中、強度が安定していること

合否基準

測定値	692V以上	←計算： 開放電圧×直列台数×0.8（照度、温度ロス）以上
平均との差	±2.38%	←計算： 1/直列数×50%（電圧に占めるモジュール1台の半分の割合）

例）Q.PEAK DUO ML-G9 390を8直列した場合
モジュールの開放電圧が41.2Vなので、測定値の基準値は、41.2×21×0.8≒692V ※小数点第1位を四捨五入
平均との差の基準は、1÷8×50≒6.25(%) ※小数点第2位を四捨五入

PCS No.	入力回路 No.	極性チェック	測定値（V）	平均値	平均との差	合否（○or×）	備考
04	1	良・否	863	861.5	0.2%	○	
	2	良・否	861		−0.1%	○	
	3	良・否	861		−0.1%	○	
	4	良・否	862		0.1%	○	
	5	良・否	861		−0.1%	○	
	6	良・否	861		−0.1%	○	
	7	良・否	863		0.2%	○	
	8	良・否	863		0.2%	○	
	9	良・否	860		−0.2%	○	
	10	良・否	860		−0.2%	○	

※測定方法
①モジュールの接続確認は、日中の晴れまたはくもり時に行います。
（雲から太陽が出たり、隠れたりするようなときは、電圧が変化するため行わないこと）
②直流入力端子台の（＋）、（－）端子にテスターをあて、各ストリングごとのアレイ出力電圧が合否基準の692V以上であれば合格とする。テスターレンジは直流電圧レンジで測定すること
③測定値を記録する。
④正常状態（晴天時）であれば、アレイ出力電圧は入力動作電圧範囲内となる
（パネル出力でいくと、21直列のため、41.2V×21直列=865.2Vまでの電圧となる。）
（直流入力電圧が865.2V以上ある場合はストリング確認をすること。）
⑤接続されたケーブルの極性が正しいか、極性を確認する。

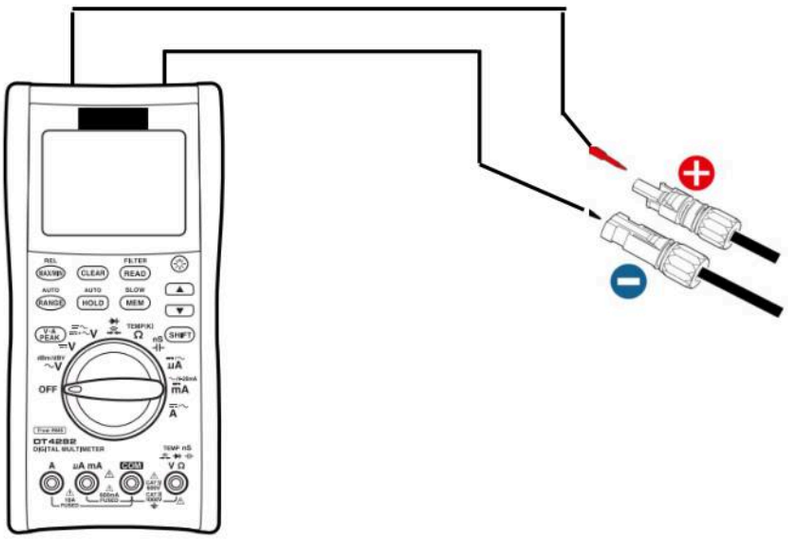

太陽電池ストリング開放電圧測定

試験日 ： 2023年 3月 7日
測定時間 ： 10時 ～ 12時
天候 ： 晴れ

実施者 [redacted]				
測定機器名	型式	[redacted]	製造番号	校正有効期限
ﾃｽﾀｰ	DT4281		1.91E+08	2022/8/4

測定実施条件： 日射強度が300W/㎡以上で、1つのPCS内の測定中、強度が安定していること

合否基準

測定値	329.6V以上	←計算： 開放電圧×直列台数×0.8（照度、温度ロス）以上
平均との差	±2.38%	←計算： 1/直列数×50%（電圧に占めるモジュール1台の半分の割合）

例）Q.PEAK DUO ML-G9 390を8直列した場合
モジュールの開放電圧が41.2Vなので、測定値の基準値は、41.2×10×0.8≒329V ※小数点第1位を四捨五入
平均との差の基準は、1÷8×50≒6.25(%) ※小数点第2位を四捨五入

PCS No.	入力回路 No.	極性チェック	測定値（V）	平均値	平均との差	合否（○or×）	備考
05	1	良・否	410	410.0	0.0%	○	
	2	良・否	410		0.0%	○	

※測定方法
①モジュールの接続確認は、日中の晴れまたはくもり時に行います。
（雲から太陽が出たり、隠れたりするようなときは、電圧が変化するため行わないこと）
②直流入力端子台の（＋）、（－）端子にテスターをあて、各ストリングごとのアレイ出力電圧が合否基準の329V以上であれば合格とする。テスターレンジは直流電圧レンジで測定すること
③測定値を記録する。
④正常状態（晴天時）であれば、アレイ出力電圧は入力動作電圧範囲内となる
（パネル出力でいくと、21直列のため、41.2V×10直列=412Vまでの電圧となる。）
（直流入力電圧が412V以上ある場合はストリング確認をすること。）
⑤接続されたケーブルの極性が正しいか、極性を確認する。

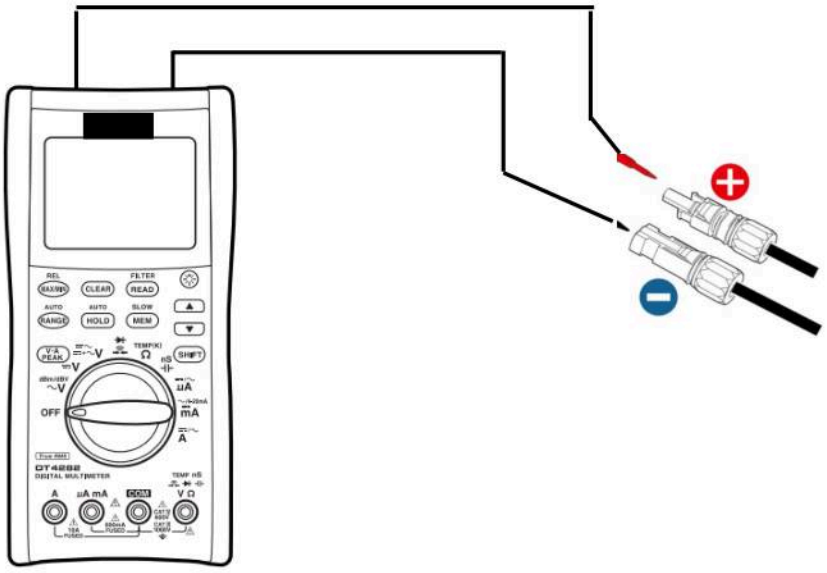

太陽電池ストリング開放電圧測定

試験日 ： 2023年 3月 7日
測定時間 ： 10時 ～ 12時
天候 ： 晴れ

実施者 [redacted]				
測定機器名	型式	メーカー	製造番号	校正有効期限
テスター	DT4281	[redacted]	1.91E+08	2022/8/4

測定実施条件： 日射強度が300W/㎡以上で、1つのPCS内の測定中、強度が安定していること

合否基準

測定値	329.6V以上	←計算： 開放電圧×直列台数×0.8（照度、温度ロス）以上
平均との差	±2.38%	←計算： 1/直列数×50%（電圧に占めるモジュール1台の半分の割合）

例）Q.PEAK DUO ML-G9 390を8直列した場合
モジュールの開放電圧が41.2Vなので、測定値の基準値は、41.2×10×0.8≒329V ※小数点第1位を四捨五入
平均との差の基準は、1÷8×50≒6.25(%) ※小数点第2位を四捨五入

PCS No.	入力回路 No.	極性チェック	測定値（V）	平均値	平均との差	合否（○or×）	備考
06	1	良・否	409	409.5	−0.1%	○	
	2	良・否	410		0.1%	○	

※測定方法
①モジュールの接続確認は、日中の晴れまたはくもり時に行います。
（雲から太陽が出たり、隠れたりするようなときは、電圧が変化するため行わないこと）
②直流入力端子台の（＋）、（－）端子にテスターをあて、各ストリングごとのアレイ出力電圧が合否基準の329V以上であれば合格とする。テスターレンジは直流電圧レンジで測定すること
③測定値を記録する。
④正常状態（晴天時）であれば、アレイ出力電圧は入力動作電圧範囲内となる
（パネル出力でいくと、21直列のため、41.2V×10直列=412Vまでの電圧となる。）
（直流入力電圧が412V以上ある場合はストリング確認をすること。）
⑤接続されたケーブルの極性が正しいか、極性を確認する。

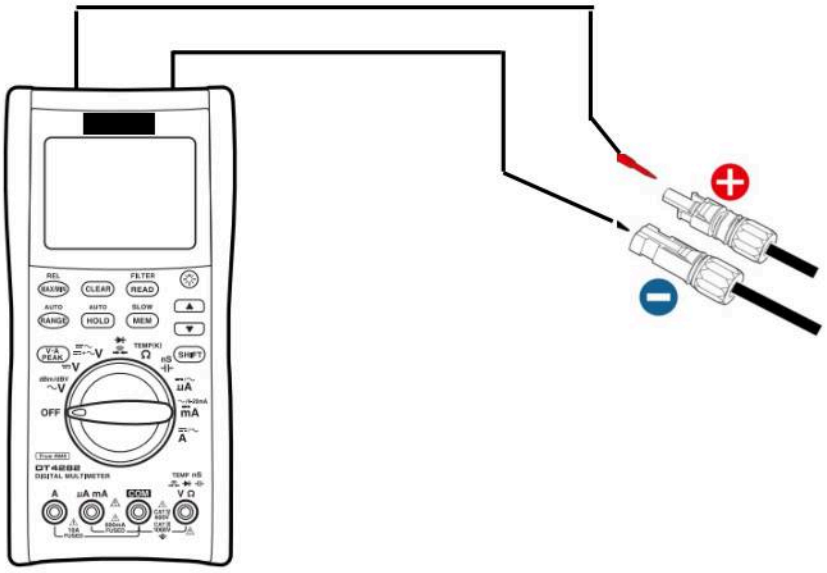

太陽電池ストリング開放電圧測定

試験日 ： 2023年 3月 7日
測定時間 ： 10時 ～ 12時
天候 ： 晴れ

実施者	[redacted]			
測定機器名	型式	メーカー	製造番号	校正有効期限
ﾃｽﾀｰ	DT4281	[redacted]	1.91E+08	2022/8/4

測定実施条件： 日射強度が300W/㎡以上で、1つのPCS内の測定中、強度が安定していること

合否基準

測定値	329.6V以上	←計算： 開放電圧×直列台数×0.8（照度、温度ロス）以上
平均との差	±2.38%	←計算： 1/直列数×50%（電圧に占めるモジュール1台の半分の割合）

例）Q.PEAK DUO ML-G9 390を8直列した場合
モジュールの開放電圧が41.2Vなので、測定値の基準値は、41.2×10×0.8≒329V ※小数点第1位を四捨五入
平均との差の基準は、1÷8×50≒6.25(%) ※小数点第2位を四捨五入

PCS No.	入力回路 No.	極性チェック	測定値（V）	平均値	平均との差	合否（○or×）	備考
07	1	良・否	411	410.0	0.2%	○	
	2	良・否	409		−0.2%	○	
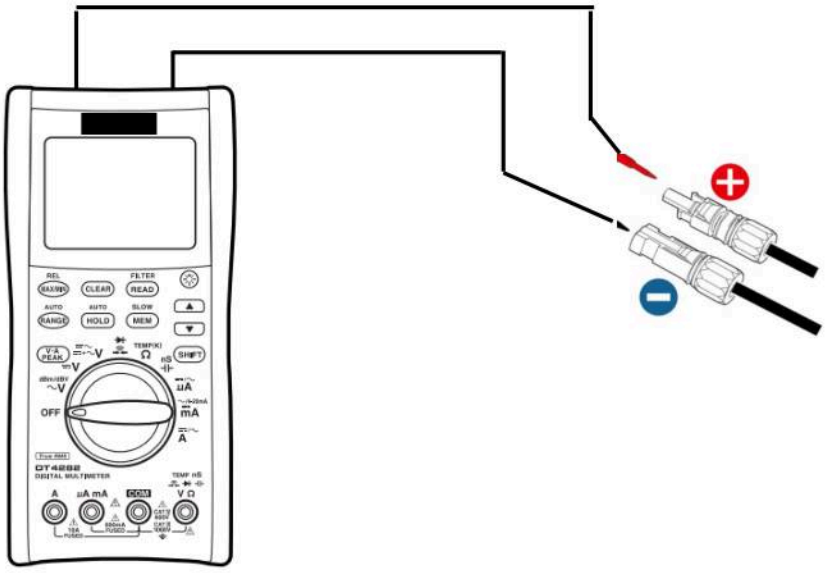
※測定方法
①モジュールの接続確認は、日中の晴れまたはくもり時に行います。
（雲から太陽が出たり、隠れたりするようなときは、電圧が変化するため行わないこと）
②直流入力端子台の（＋）、（－）端子にテスターをあて、各ストリングごとのアレイ出力電圧が合否基準の329V以上であれば合格とする。テスターレンジは直流電圧レンジで測定すること
③測定値を記録する。
④正常状態（晴天時）であれば、アレイ出力電圧は入力動作電圧範囲内となる
（パネル出力でいくと、21直列のため、41.2V×10直列=412Vまでの電圧となる。）
（直流入力電圧が412V以上ある場合はストリング確認をすること。）
⑤接続されたケーブルの極性が正しいか、極性を確認する。
